


丰顺县潭江镇安顺兴石场有限公司临时用地土地复垦竣工图

项目工程完成情况表

| 工程内容     |        | 单位              | 计划数    | 完成数    | 工程质量<br>(合格/不合格) | 备注                                            |
|----------|--------|-----------------|--------|--------|------------------|-----------------------------------------------|
| 工程内容     | 水泥地坪拆除 | m <sup>3</sup>  | 28     | 28     | 合格               |                                               |
|          | 桩基拆除   | m <sup>3</sup>  | 43     | 43     | 合格               |                                               |
|          | 土地平整   | m <sup>3</sup>  | 4500   | 4625   | 合格               |                                               |
| 土壤重构工程   |        | m <sup>3</sup>  | —      | 2432   | 合格               |                                               |
| 土地翻耕(一次) |        | hm <sup>2</sup> | 1.054  | 0.8108 | 合格               |                                               |
| 浸田翻耕(三次) |        | hm <sup>2</sup> | 0.452  | 0.0817 | 合格               |                                               |
| 播种工程     |        | 株               | 316    | 1250   | 合格               | 马尾松<br>H=1.0m, 间距2.5m<br>高桥毛、大豆、白薯草<br>20kg/㎡ |
| 撒播草籽     |        | hm <sup>2</sup> | 0.3611 | 0.7291 | 合格               |                                               |
| 土质排水沟    |        | m               | —      | 211    | 合格               | 土质梯形<br>(上口宽0.5m, 下底宽0.1m, 高0.4m)             |
| 引水管      |        | m               | —      | 141    | 合格               | 20mpe管                                        |
| 挡土墙      |        | m               | —      | 120    | 合格               | C20砼, 高2.4米, 宽0.3米                            |

|  |        |  |      |
|--|--------|--|------|
|  | 临时用地范围 |  | 水田   |
|  | 乔木林地   |  | 乔木林地 |
|  | 水田     |  | 灌木林  |
|  | 水工建筑用地 |  | 果园   |
|  | 农村道路   |  | 高点   |
|  | 新修排水沟  |  | 水流方向 |
|  | 新修挡土墙  |  | 陡坡   |

图例

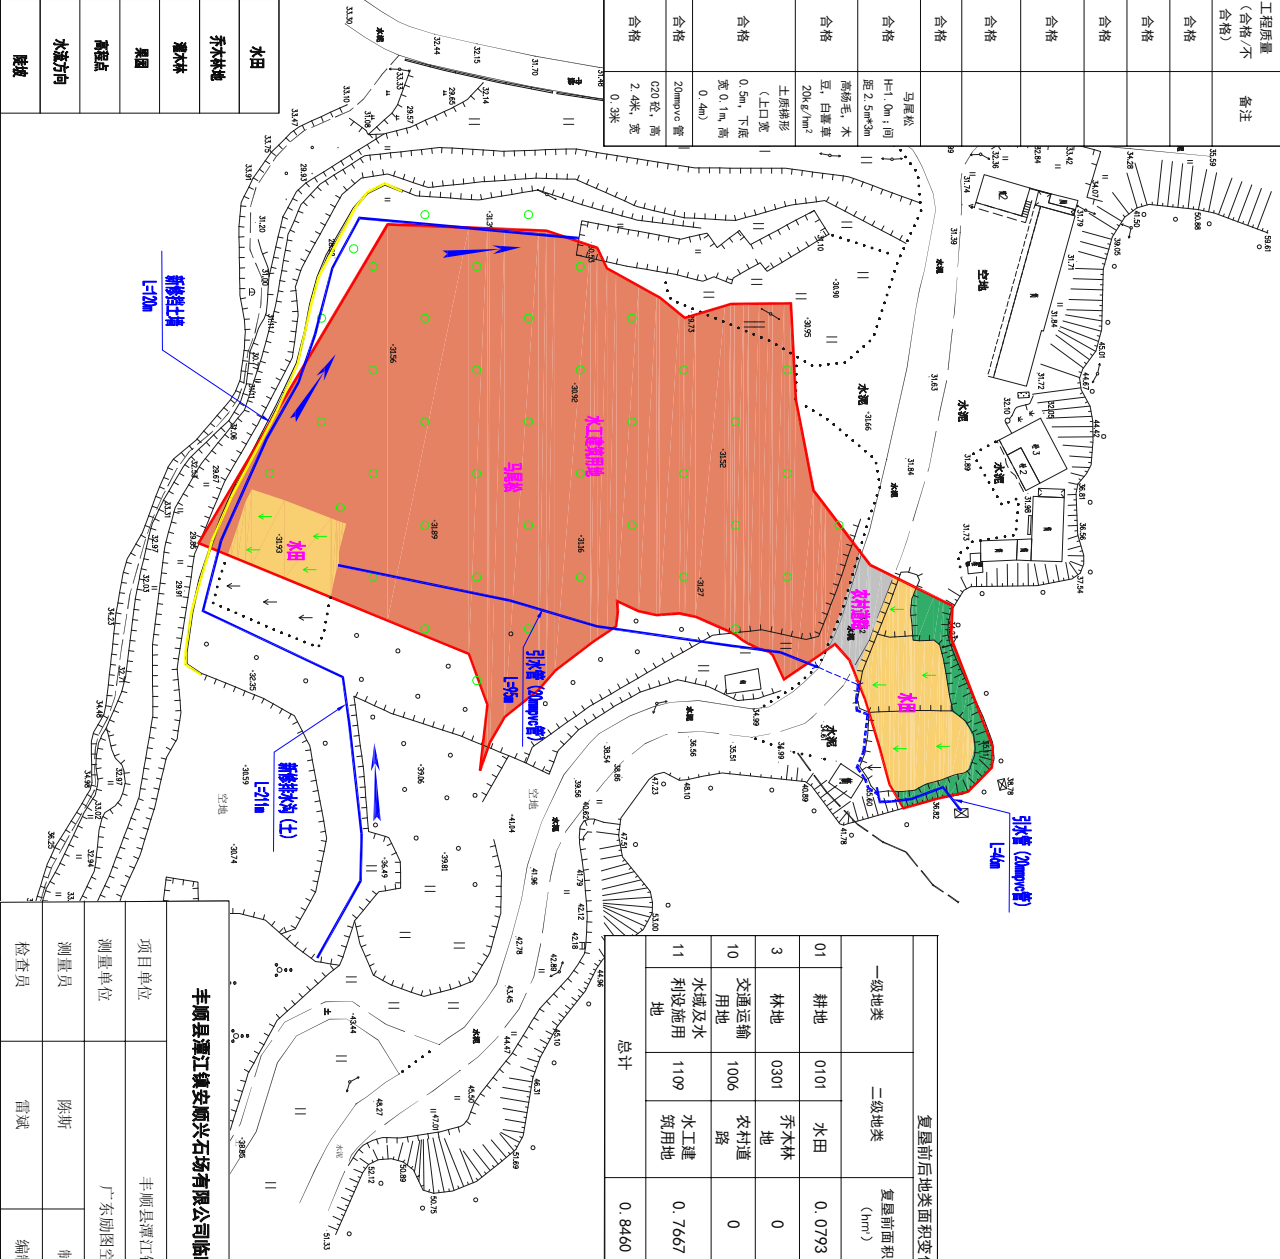

| 复垦前后地类面积变化情况表 |           |                             |                             |
|---------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| 一级地类          | 二级地类      | 复垦前面积<br>(hm <sup>2</sup> ) | 复垦后面积<br>(hm <sup>2</sup> ) |
| 01            | 耕地        | 0.0793                      | 0.0817                      |
| 3             | 林地        | 0                           | 0.0217                      |
| 10            | 交通运输用地    | 0                           | 0.0135                      |
| 11            | 水域及水利设施用地 | 0.7667                      | 0.7291                      |
| 总计            |           | 0.8460                      | 0.8460                      |



丰顺县潭江镇安顺兴石场有限公司临时用地土地复垦竣工图

|      |                 |      |         |
|------|-----------------|------|---------|
| 项目单位 | 丰顺县潭江镇安顺兴石场有限公司 |      |         |
| 测量单位 | 广东图图空间信息技术有限公司  |      |         |
| 测量员  | 陈斯              | 制图员  | 吕业伟     |
| 检查员  | 雷斌              | 编制日期 | 2023.12 |

2000 国家大地坐标  
1985 国家高程基准

1 : 2000
